QTÉ. Total	QTÉ. UNIT.	MARQUE	DESCRIPTION	LONG.	POIDS UNIT.	REMARQUES
1	1	C-309	HSS 6 x 6 x 9/16	25'-2 1/2"	979.6	350W
2	2	2AX	STD.	-	5.2	300W
2	2	4AX	STD.	-	10.8	300W
2	2	5AX	STD.	-	13.4	300W
1	1	CP6	STD.	-	2.6	300W
1	1	BP-1	PL 8" x 1 1/4"	10"	27.7	300W

POIDS TOTAL: 1 039.3

Boulons de Chantier	
Qte	Description
	3/4 Dia. A325 x 1 3/4"
	3/4 Dia. A325 x 2"
4	3/4 Dia. A325 x 2 1/4"
	3/4 Dia. A325 x 2 1/2"
7	3/4 Dia. A325 x 2 3/4"

Dessin. L.L.		Verif. R.B.	
Peinture:		Trou Std: 13/16"Ø	
Acier: ASTM A-992		Soudure: E70XX ELECT.	
#	Description	Date	Par

Projet: MODULE 16 Détail d'acier	C-309 (Mini-Test 5)
COLONNE HSS (POUTRE)	
Titre: Page 60	
Poids total: 1 039.3	
	Date: 15 mars 2019

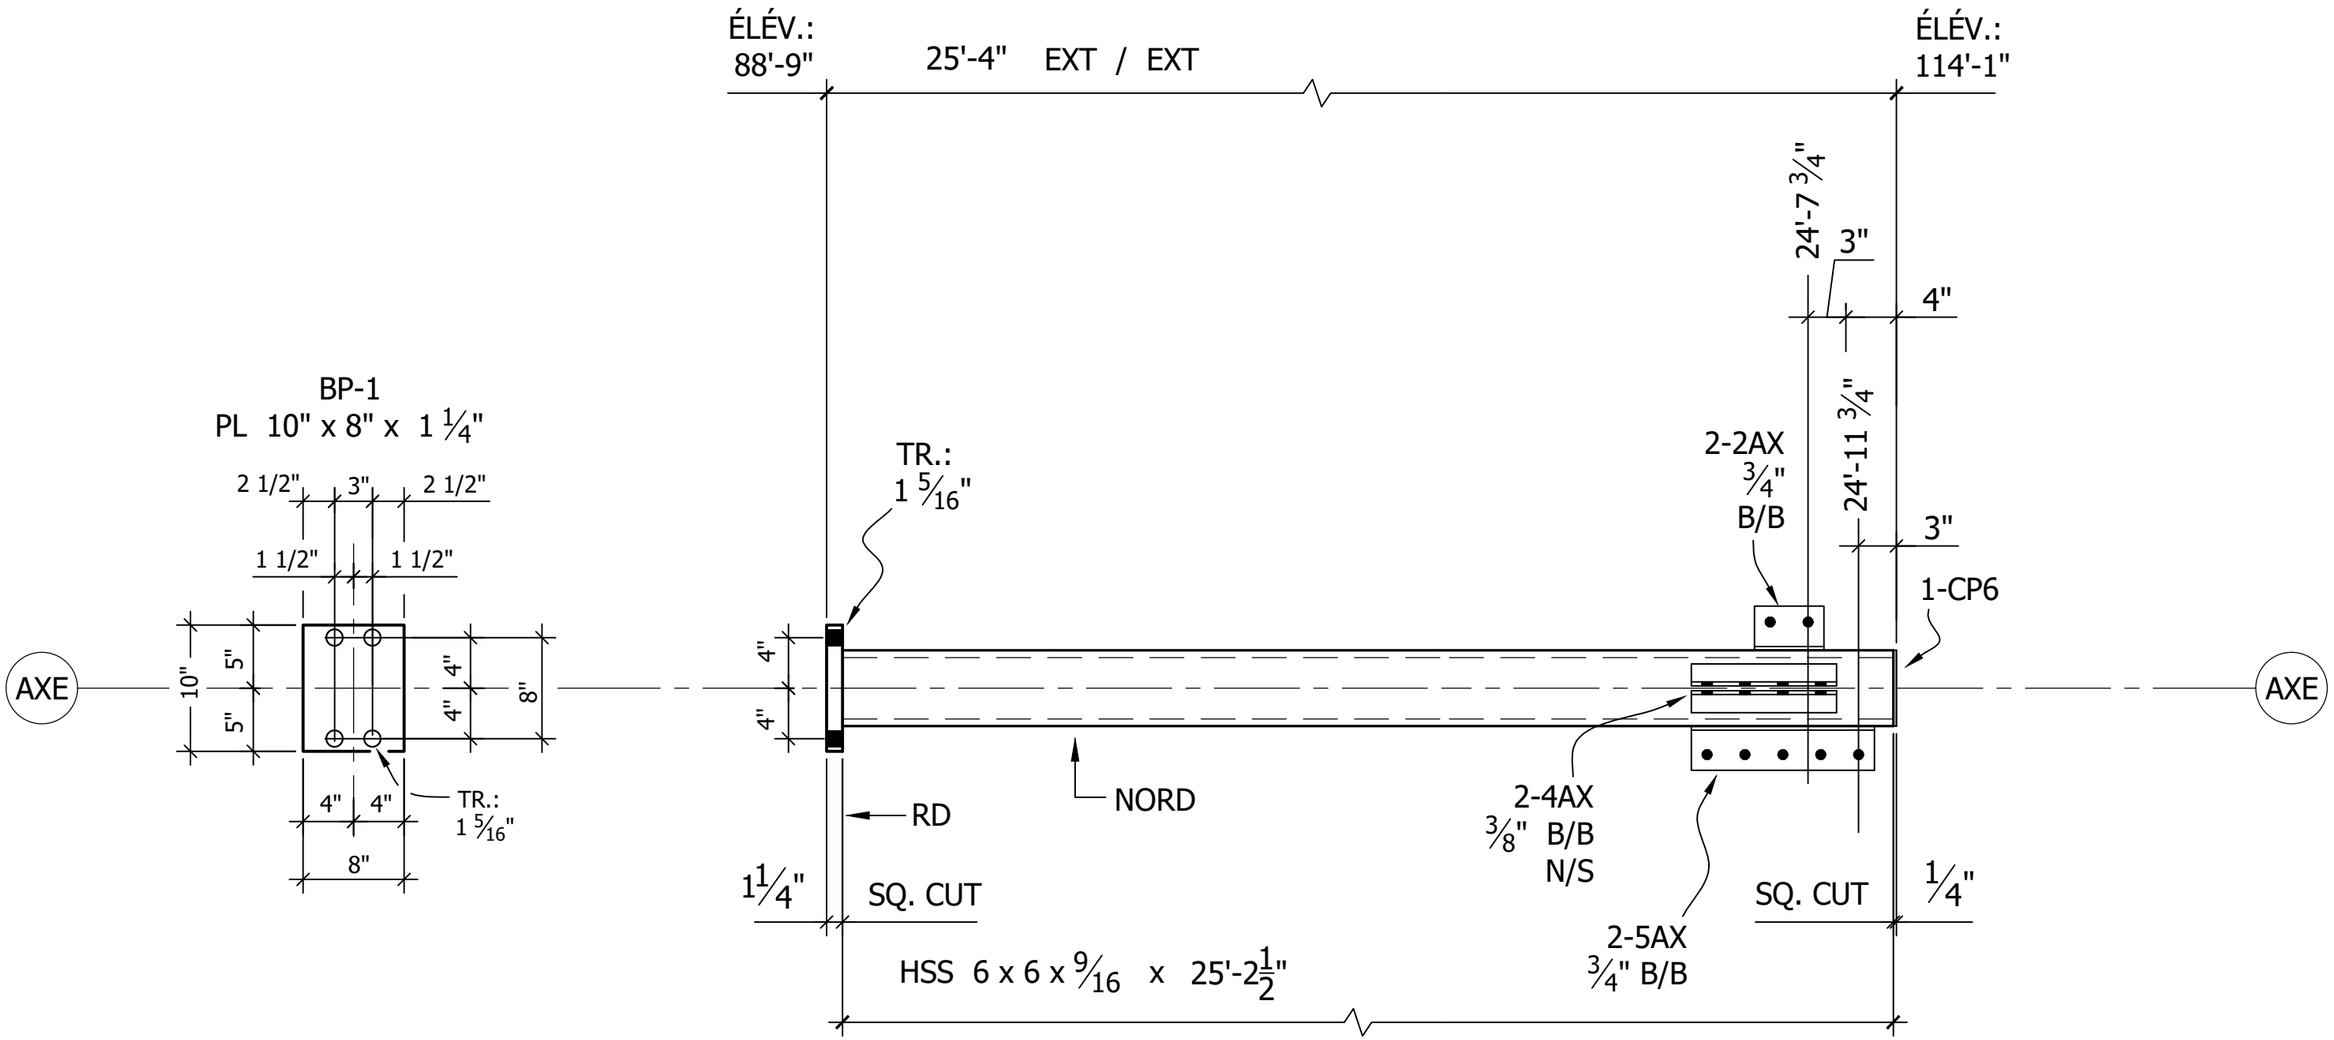

C-309 (mini-test 5)
